

陕北~湖北±800kV 特高压直流输电工程

(陕西段)

水土保持监测季度报告

(总第7期)

监测时段：2021年1月1日~3月31日

2021年4月北京

目 录

生产建设项目水土保持监测报告表.....	1
生产建设项目水土保持三色评价指标及赋分表.....	3
1 监测工作实施情况.....	4
1.1 监测工作开展情况.....	4
1.2 监测点位.....	4
2 监测方法及频次.....	6
2.1 监测方法.....	6
2.2 监测频次.....	10
3 重点监测内容.....	11
3.1 防治责任范围监测.....	11
3.2 土石方情况监测.....	11
3.3 水土流失状况监测.....	12
3.4 水土流失灾害事件.....	12
3.5 水土流失防治效果.....	12
3.6 水土流失主要因子调查.....	12
4 水土保持措施监测.....	14
4.1 主体工程进展.....	14
4.2 水土保持工程建设情况.....	14
4.3 水土保持工程设计情况.....	15
5 相关管理情况.....	16
5.1 建设单位水土保持管理.....	16
5.2 水土保持监测意见落实情况.....	16
6 问题及建议.....	17
7 综合评价.....	17
8 下步工作计划.....	17
9 附件及照片.....	18
9.1 影像资料.....	18
9.2 典型问题及整改建议.....	21

生产建设项目水土保持监测报告表

监测时段：2021年1月1日至3月31日

项目名称	陕北~湖北±800kV 特高压直流输电工程（陕西段线路工程）					
建设单位 联系人及 电话	郑树海 13161763227	监测项目负责人 (签字): 				
	填表人 及电话	李建兴 13832876163				2021年4月14日
开工时间	2019年6月	计划完工时间	2021年9月			
主体工程 工程进度	本工程陕西省境内线路部分2个施工标段，设计新建杆塔414基，至3月底累计开挖414基；累计组塔414基；累计架线224km。					
	项目	单位	设计总量	本季度	累计	
扰动土地 面积	塔基区	hm ²	41.75	0	41.1	
	牵张场区	hm ²	6.8	0	4.8	
	跨越施工场地区	hm ²	1.24	0	0.7	
	施工道路区	hm ²	26.7	0	27.42	
	拆迁场地区	hm ²				
	合计	hm ²	76.49	0	74.02	
	弃土（渣）场数量	个	0	0	0	
弃土量	其他弃土	万 m ³	0	0	0	
	拦渣率	%	--	--		
水土保持工程措施						
分区	项目	单位	方案批复	专项设计	本季度	累计
塔基区	浆砌石护坡	m ³	198	/	0	0
	浆砌石挡土墙	m ³	132	/	0	180.2
	浆砌石截排水沟	m ³	396	/	0	130
	表土剥离	m ³	20280	29176	0	27523
	表土回覆	m ³	20280	29176	0	26823
	土地整治	hm ²	14.62	22.343	1.91	17.8745
	耕地恢复	hm ²	28.52	21.611	0	19.2832
牵张场区	土地整治	hm ²	2.7	9.268	0.16	6.468
	耕地恢复	hm ²	2.73	3.372	0.26	2.772
跨越 施工场地区	土地整治	hm ²	0.78	0.34	0	0.18
	耕地恢复	hm ²	0.7	0.34	0	0.18
施工道路区	表土剥离	m ³	/	2243	0	2243
	表土回覆	m ³	/	2243	0	2243
	土地整治	hm ²	12.97	14.5595	0.23	2.2459
	耕地恢复	hm ²	10.52	5.40511	0.28	2.3806

续前表:

植物措施						
分区	项目	单位	方案批复	专项设计	本季度	累计
塔基区	草籽	hm ²	14.62	22.343	1.28	12.6145
牵张场区	草籽	hm ²	2.7	9.268	0.81	6.09
跨越施工场地区	草籽	hm ²	0.78	0.34	0	0
施工道路区	草籽	hm ²	12.97	17.4669	0.13	5.9399
临时措施						
分区	项目	单位	方案批复	专项设计	本季度	累计
塔基区	临时堆土苫盖	m ²	33178	58439	785	51899
	填土编织袋拦挡	m ³	10565	4281	0	5980
	彩条布铺垫	m ²	25370	42466	2375	40262
	彩旗绳围栏	m	23750	33563	0	30671
牵张场区	彩条布铺垫	m ²	5580	5850	150	3300
	钢板铺垫	m ²	3700	7800	0	4000
	彩旗绳围栏	m	2580	5265	135	2970
施工道路区	临时排水沟	m ³	2133	2133	0	2100
	素土夯实	m ³	2133	2133	0	2100
降雨量	(1) 府谷 42mm、神木 35.3mm、佳县 53.5mm、米脂 40.8mm、绥德 45.3mm、清涧 23.9mm。 (2) 降水强度和日最大降水量: 线路经过的 6 个县均未出现大雨和暴雨。					
土壤流失量	总计 1603.97t。按分区统计为: 塔基区 891.87t、牵张场区 15.19t、跨越施工场地区 104.16t、施工道路区 592.75t, 。					
水土流失灾害事件	无					
存在问题与建议	(1) 山丘区部分塔基临时拦挡措施防护不到位, 存在溜坡隐患的, 要加强临时拦挡措施的实施; (2) 部分塔基有冲沟发育, 要尽快平整冲沟; (3) 加强塔基区的植被恢复。					

生产建设项目水土保持三色评价指标及赋分表

项目名称		陕北~湖北±800kV 特高压直流输电工程（陕西段）		
监测时段和防治责任范围		2021 年第 1 季度，76.49hm ²		
三色评价结论		绿色□ 黄色√ 红色□		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	不存在擅自扩大施工扰动面积超过 1000m ² 的区域
	表土剥离保护	5	5	不存在未实施表土剥离面积超过 1000 m ² 的区域
	弃土（石、渣）堆放	15	15	无新增弃渣场
水土流失状况		15	3	本季度土壤流失总量为 1603t（取土壤密度为 1.4g/cm ³ ），约为 1145m ³ 。根据每 100 立方扣一分（>100 公顷项目），本项目（<100 公顷）扣除 12 分。
水土 流失 防治 效果	工程措施	20	15	土地整治措施还有 5 处未实施或不完善，扣 5 分
	植物措施	15	12	部分塔基区 4 处塔基植物措施恢复效果不理想，扣 3 分
	临时措施	10	7	塔基区、施工道路区临时拦挡防护效果不到位 3 处或措施不到位，本项目扣 3 分。
水土流失危害		5	5	无水土流失危害现象发生
合计		100	77	

1 监测工作实施情况

1.1 监测工作开展情况

(1) 参加国网陕西电力有限公司陕湖业主项目部组织召开的第一季度水土保持工作会议，我公司对本季度巡查开展的监测工作情况进行了汇报。

(2) 收集降雨量等气象资料，收集施工及监理单位主体工程施工进度等相关资料，结合现场监测分析项目区扰动土地面积及土石方挖填方数量、流向。

(3) 按直流公司统一安排，选取现场航拍照片上传到“电网工程管理系统”；同时对有代表性的典型问题列出清单，上报牵头单位，由直流公司统一发文下达到施工单位，按照整改意见落实后反馈效果照片和文字说明。

(4) 每月初向水保牵头单位提交上月现场施工情况报告，包括主体工程进度、开工塔基扰动面积、表土剥离、余土处理、土壤流失监测、水土流失事件、现场存在的典型问题和施工单位反馈的整改情况等，由牵头单位向直流公司汇报整改情况。

(5) 向黄河水利委员会、陕西省水利厅等水行政主管部门和建设单位报送季报和年报，并协助建设单位在官网进行公示。

(6) 对线路进行了巡查，采用遥感、无人机、GPS、坡度仪、卷尺等工具对施工现场进行了调查，抽样记录了各防治分区的地形地貌及水土流失现状。

(7) 根据水土保持方案批复的水土流失防治分区和监测重点区域，项目部组织工作人员对项目现场各分区踏勘，并布设水土保持监测点。

1.2 监测点位

按本项目水土保持方案及其批复要求，全线共设置水土流失固定监测点位6处（详见表1-2）。

表 1-2 监测点布设情况表

标段	监测点位置	设置日期	塔基号	数量	监测方法
1 标段	塔基区	2020.6	N160	1	测钎+全站仪 断面高程测量法
		2019.6.20	N220	1	
	施工道路	2019.6.20	N220	1	
2 标段	塔基区	2019.6.23	N344	1	
	塔基区	2020.6	N283	1	
	施工道路	2019.6.23	N344	1	

1 监测工作实施情况



图 1.2-1 监测点位测量


2 监测方法及频次

2.1 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）规定的要求，本项目水土保持监测主要采用实地调查监测、地面观测、无人机航拍、遥感监测、定位监测等方法。

2.1.1 遥感监测

根据工程施工情况，获取项目区施工前、施工中和试运行期不同时段遥感影像，对工程建设全过程的遥感影像进行处理，得到监测期各项数据，通过对比分析，计算各类监测指标，得到水土保持动态监测结果。监测对象为防治责任范围内各分区，成果数据包括各分区遥感影像、防治责任范围、位置、扰动面积、措施数量等。

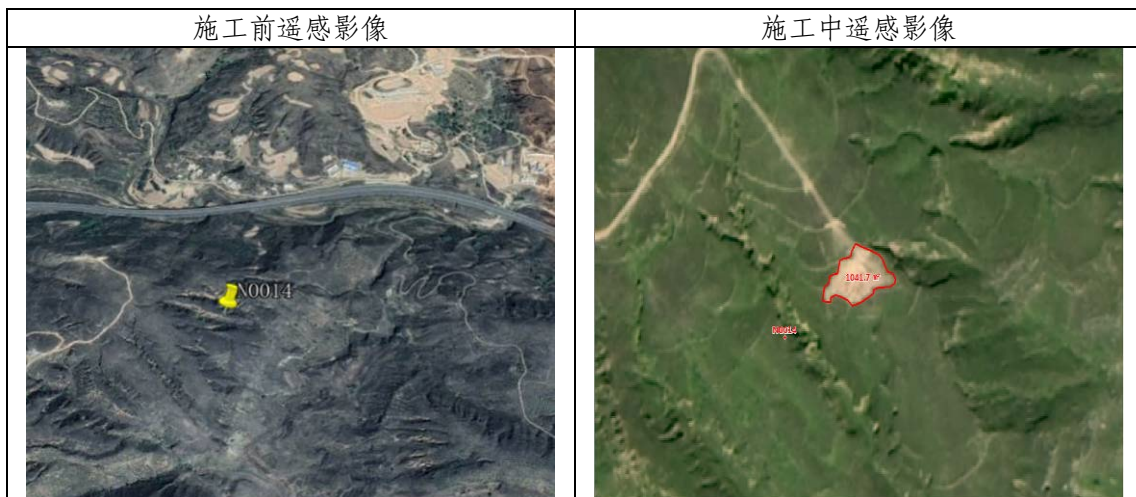

2.1.2 无人机航拍

工程建设过程中，定期进行无人机航拍，并对工程不同时期的航拍影像进行对比分析，得到水土保持动态监测结果。借助无人机，可对工程部分难以抵达的区域实现全面监测，避免出现监测盲点，确保水土保持监测工作高效、安全地开展。



图 2.1-1 无人机航拍操作

2.1.3 人工现场核查

人工现场核查主要包括两个方面。

(1) 核实扰动面积

主要是对遥感解译和无人机航拍的扰动面积进行现场圈定，方法有皮尺丈量、GPS 测量、全站仪测量等，具有直观性强、定性准确、定量精度高等优点。现场核查的数据不仅对本次应用可信，还可以在对比分析基础上修正影像比对库基础值。

(2) 确认现场水保措施的实施程度

从现场不同角度直接观察、拍照留存具有立体性强、局部清晰度高等优点，更能够直观地监测施工现场情况，可作为遥感解译和无人机影像的补充资料。例如，通过侧拍不同角度陡坡及临崖堆土（渣石），可真实立体的呈现可能存在的水土流失隐患。从下面无人机俯视影像与照相机近景仰角拍摄对比图看，现场监测照片是重要的直观定性之补充。

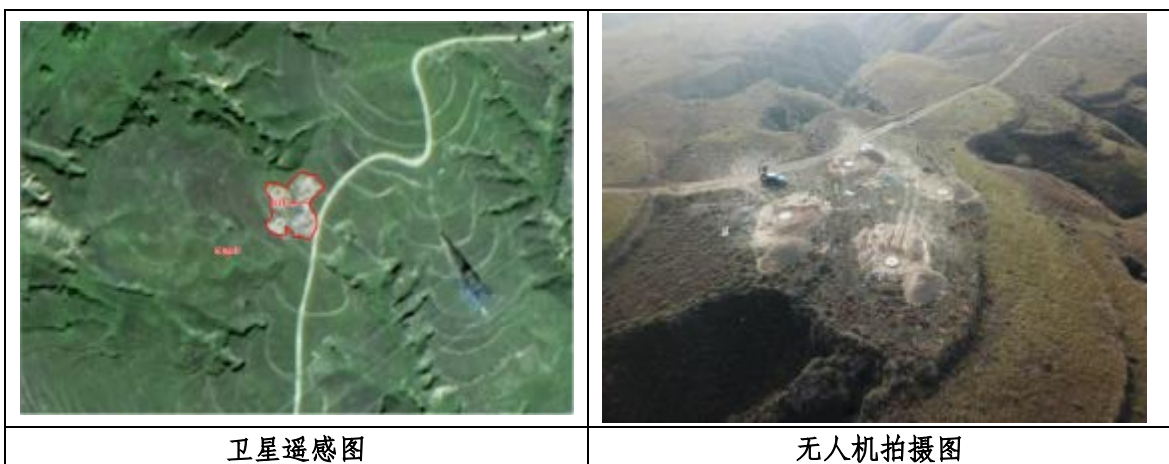




图 2.1-2 遥感影像、无人机影像与照相机拍摄对比图

2.1.4 定位监测

根据工程施工进度、施工扰动范围、水土流失特点确定可进行实时地面定位观测的监测项目，对应确定地面定位观测方法。本工程地面定位观测主要以测钎法、侵蚀沟法、全站仪测点法为主。

2.1.4.1 测钎法

测钎法即标桩法。布设样地规格一般为 $5\text{m} \times 20\text{m}$ 。将直径 $0.6\text{--}1\text{cm}$ 、长 $50\text{--}100\text{cm}$ 的钢钎，在选定的坡面样方小区按照 $1\text{m} \times 5\text{m}$ 的间距分纵横方向，共计21支钢钎，按照梅花形布设，垂直打入地下，使钢钎钉帽与坡面齐平，并在钉帽上涂上油漆，注明编号。

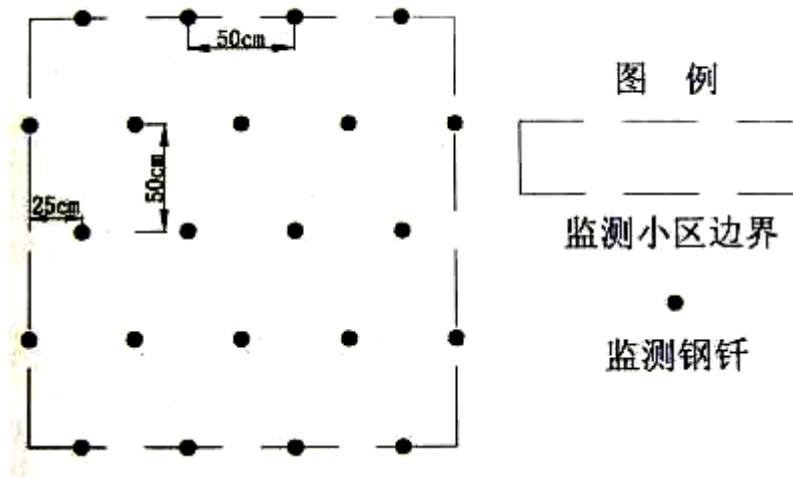


图 2.1-3 测钎法示意图

在每次暴雨后和汛期结束时，观测钉帽距地面的高度，计算土壤侵蚀深度和总的水土流失数量。计算公式为：

$$A = \frac{ZS}{1000 \cdot \cos \theta}$$

式中：A-土壤侵蚀量（m³）； Z-侵蚀深度（mm）；

S-水平投影面积（m²）； θ-斜坡坡度

2.1.4.2 侵蚀沟量测法

侵蚀沟量测法又称简易坡面量测法。主要用于土质边坡、土或土石混合或粒径较小的石砾堆等坡面的水土流失量的测定。调查坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的每次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，计算水土流失。

在建设范围内相对稳定的堆积土坡面或开挖坡面，布设侵蚀沟观测小区。依据细沟侵蚀发生、发展规律，在小区内从坡上到坡下，布设 3-5 个等距施测断面，量测每个断面细沟的深度和宽度（精确到 mm），测完每个断面后，绘制小区内细沟分布图，再计算细沟侵蚀量。在测得单个细沟侵蚀量后，将其累加即可得到小区内细沟侵蚀总量。

在调查样地上等间距取若干个断面（B 样地宽×L 坡长），每个断面上量测侵蚀沟的断面积，然后按下式进行计算：

$$M = \frac{1}{2} r \sum_{i=1}^n (s_i + s_{i+1}) \times l$$

式中：M——样地侵蚀量，t；

S_i——第 i 个断面的面积，m²；

S_{i+1}——第 i+1 个断面的面积，m²；

l——样地断面间距，m；

r——土壤容重，t/m³；

n——断面数。

也可以将侵蚀沟概化为棱锥、棱柱、棱台等，按下式计算：

棱锥体积：V=S•H/3

棱柱体积：V=S•H

棱台体积：V=H• [S₁+S₂+ (S₁•S₂)^{1/2}] /3

式中：V——体积，cm³；

S_1 、 S_2 、 S ——底面积， cm^2 ;

H ——高， cm 。

2.1.4.3 测钎+全站仪监测土壤流失量

测钎+全站仪断面高程测量法是在原测钎法基础上的改进版，在本项目中的应用主要是对土壤侵蚀深度的监测。其原理同单独的测钎法类似：在被测样方地适合断面进行高程测量的方法（也可简称仪器法），即保留测量样方两端的测钎同时做成隐蔽状态以利保护，去掉中间的测钎，拉线后用仪器沿线密集立尺（镜）测量高程值。这种方法在工地实际应用效果较好，优点是既不影响作业面的施工操作和施工道路的人车通行，又提高了量测精度，两次测量平均高差即为该时段的土壤侵蚀深度，从而计算推算所代表侵蚀区域的土壤流失量。

2.2 监测频次

扰动土地情况监测频次每月度1次。水土保持工程措施每月监测记录1次，其他每季度监测1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月监测记录1次。遇暴雨、大风等情况及时加测。

3 重点监测内容

本季度处于施工期，重点监测内容包括防治责任范围、土石方情况、水土流失量、水土流失灾害事件、水土流失防治效果、水土流失因子、项目区降水状况等。

3.1 防治责任范围监测

本季度未新增扰动面积，累计扰动面积 74.02hm²。

截止本季度末各分区统计防治责任范围为塔基区 41.1hm²，牵张场区 4.8hm²，跨越施工场地施工区 0.7hm²，施工道路区 27.42hm²，在实际施工中施工道路均是施工便道，未修人抬道路，故施工道路区的实际扰动面积超过了方案设计。

表 3.1-1 防治责任范围统计表 单位: hm²

项目	方案设计			本季度新增	实际	
	项目建设区	直接影响区	合计	项目建设区	项目建设区	
防治 责任 范围	塔基区	41.75	13.65	55.4	0	41.1
	牵张场区	6.8	1.36	8.16	0	4.8
	跨越施工场地	1.24	0.62	1.86	0	0.7
	施工道路区	26.7	22.2	48.9	0	27.42
	拆迁场地区	/	1.59	1.59	0	0
	合计	76.49	39.42	115.91	0	74.02

3.2 土石方情况监测

本项目土石方挖填方总量 21.52 万 m³，其中挖方总量为 11.73 万 m³（一般土方 9.13 万 m³，剥离表土 2.6 万 m³），填方总量 9.79 万 m³（工程建设 7.19 万 m³，表土回覆 2.6 万 m³），临时堆放 1.68 万 m³，余方 0.26 万 m³，具体土石方平衡情况见表 3.2-1。

表 3.2-1 本项目土石方平衡表 单位: 万 m³

分区	挖方			填方			临时堆 放	调出	调入	余方	
	表土	一般 土方	小计	表土	一般土 方	小计				数量	去向
塔基区	2.6	5.35	7.95	2.6	5.09	7.69		0.26		0.26	综合利用
施工便道区		3.6	3.6		2.1	2.1	1.5		0.26		
牵张场区		0.18	0.18			0	0.18				
合计	2.6	9.13	11.73	2.6	7.19	9.79	1.68	0.26	0.26	0.26	

3.3 水土流失状况监测

通过现场调查和监测，本项目水土流失类型主要为水力侵蚀和风蚀，主要形式为因降雨形成的沟蚀，主要分布在坡度较大的堆土和顺坡施工道路，主要集中在陡坡地段，重点施工区域包括塔基区和施工道路区。

本季度项目建设区的土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，表现形式为面蚀和沟蚀。通过利用水土保持在线监测系统进行了观测土壤侵蚀情况，经分析计算，本季度项目区的土壤侵蚀量为 1603.97t。

按分区统计为：塔基区 891.87t、牵张场区 15.19t、跨越施工场地区 104.16t、施工道路区 592.75t，见下表 3.3-1。

表 3.3-1 土壤流失量计算表 单位：t

分 区	1 月	2 月	3 月	1-3 月合计
塔基区	143.85	281.95	466.07	891.87
跨越施工场地区	16.8	32.93	54.43	104.16
牵张场区	2.45	4.8	7.94	15.19
施工道路区	95.6	187.39	309.76	592.75
合 计	258.7	507.07	838.2	1603.97

3.4 水土流失灾害事件

经监测人员调查统计，本季度项目区内无水土流失灾害事件发生。

3.5 水土流失防治效果

施工单位采取了挡墙、截排水沟、苫盖等临时防护措施，有效防止了水土流失，目前本项目处于施工建设期，各项水土保持措施正在实施之中，已建成的水土保持设施均发挥防护效益。

3.6 水土流失主要因子调查

通过查阅相关资料和实地测量的方法，获取项目区水土流失因子，并利用遥感图像数字处理手段，结合 DEM 地形数据，提取项目区水土流失主要因子，得到项目区水土流失主要因子背景值，为监测工作提供导向。

其中，项目区的降水状况如下：

线路工程经过陕西 6 个县，依据各县气象资料统计第 1 季度降水情况分别为：

3 重点监测内容

府谷 42mm、神木 35.3mm、佳县 53.5mm、米脂 40.8mm、绥德 45.3mm、清涧 23.9mm。

降水强度和日最大降水量：线路经过的 6 个县均未出现大雨和暴雨，见表 3.6-1。

表 3.6-1 陕西段第 1 季度分县各月降水情况统计表 单位：次、mm、月.日

分县	月份	降水	侵蚀性降水	月次数	月总量	日最大	发生日
府谷	1	1	0	1	0.3	0.3	1.25
	2	2	0	2	9.1	5.7	2.28
	3	6	1	6	32.6	17.6	3.19
	季度合计	9	1	9	42	/	/
神木	1	2	0	0	0.9	0.5	1.25
	2	2	0	0	3.8	2.2	2.28
	3	5	1	5	30.6	15.3	3.19
	季度合计	9	1	9	35.3	/	/
佳县	1	2	0	2	1.5	1.3	1.24
	2	2	1	2	18	15.8	2.28
	3	5	2	5	34	17.7	3.19
	季度合计	9	3	9	53.5	/	/
米脂	1	1	0	1	2.2	2.2	1.24
	2	3	1	3	15.8	13	2.28
	3	6	2	6	32.8	13.8	3.19
	季度合计	10	3	10	40.8	/	/
绥德	1	1	0	1	1.1	1.1	1.24
	2	3	1	3	14.8	11.3	2.28
	3	4	1	4	29.4	13.9	3.19
	季度合计	8	2	8	45.3	/	/
清涧	1	1	0	1	1.2	1.2	1.24
	2	3	1	3	18.9	11.3	2.28
	3	4	1	4	19.8	11.4	3.19
	季度合计	8	2	8	23.9	/	/

4 水土保持措施监测

4.1 主体工程进展

本工程陕西省境内线路部分2个施工标段，设计新建杆塔414基，至3月底累计开挖414基，累计组塔414基，累计架线224.012km，牵张场32处，跨越38处，详见表4.1-1。

表 4.1-1 各标段塔基施工进度情况表

项目	总数 (基)	开挖 (基)	浇筑 (基)	组塔 (基)	架线 (km)	牵张场 (处)	跨越 (处)	索道 (处)
陕1	210	210	210	210	109.642	12	16	0
陕2	204	204	204	204	114.370	20	22	0
合计	414	414	414	414	224.012	32	38	0

4.2 水土保持工程建设情况

4.2.1 工程措施

截止本季度末，累计完成浆砌石挡土墙180.2m³，浆砌石截水沟130m³，表土剥离29766m³，表土回覆29066m³，土地整治26.7684hm²，耕地恢复24.6158hm²，详见表4.2-1。

表 4.2-1 陕西境内 2021 年第 1 季度水保工程措施进度表

分区	项目	单位	方案批复	专项设计	本季度	累计
塔基区	浆砌石护坡	m ³	198	/	0	0
	浆砌石挡土墙	m ³	132	/	0	180.2
	浆砌石截排水沟	m ³	396	/	0	130
	表土剥离(人工)	m ³	20280	29176	0	27523
	表土回覆(人工)	m ³	20280	29176	0	26823
	土地整治(人工)	hm ²	14.62	22.343	1.91	17.8745
	耕地恢复(人工)	hm ²	28.52	21.611	0	19.2832
牵张场区	土地整治(机械)	hm ²	2.7	9.268	0.16	6.468
	耕地恢复(机械)	hm ²	2.73	3.372	0.26	2.772
跨越施工场地区	土地整治(人工)	hm ²	0.78	0.34	0	0.18
	耕地恢复(人工)	hm ²	0.7	0.34	0	0.18
施工道路区	表土剥离	m ³	/	2243	0	2243
	表土回覆	m ³	/	2243	0	2243
	土地整治(人工)	hm ²	12.97	14.5595	0.23	2.2459
	耕地恢复(人工)	hm ²	10.52	5.40511	0.28	2.3806

4.2.2 植物措施

截止本季度末，陕西段在塔基区累计撒播草籽12.6415hm²，牵张场区累计

6.09hm²，施工道路区累计 5.9399hm²，详见表 4.2-2。

表 4.2-2 陕西境内 2021 年第 1 季度度水土保持植物措施进度表

分区	项目	单位	方案批复	专项设计	本季度	累计
塔基区	草籽	hm ²	14.62	22.343	1.28	12.6145
牵张场区	草籽	hm ²	2.7	9.268	0.81	6.09
跨越施工场地区	草籽	hm ²	0.78	0.34	0	0
施工道路区	草籽	hm ²	12.97	17.4669	0.13	5.9399

4.2.3 临时措施

截止本季度末，陕西段塔基区完成临时堆土苫盖 51889m²，临时拦挡 5980m³，彩条布铺垫 40262m²，彩旗绳围栏 30671m；牵张场彩条布铺垫 3300m²，钢板铺垫 4000m²，彩旗绳围栏 2970m；施工道路区临时排水 2100m³，素土夯实 2100m³，详见表 4.2-3。

表 4.2-3 陕西段线路 2021 年第 1 季度度水土保持临时措施统计表

分区	项目	单位	方案报告书	专项设计	本季发生	累计
塔基区	临时堆土苫盖	m ²	33178	58439	785	51899
	填土编织袋拦挡	m ³	10565	4281	0	5980
	彩条布铺垫	m ²	25370	42466	2375	40262
	彩旗绳围栏	m	23750	33563	0	30671
牵张场区	彩条布铺垫	m ²	5580	5850	150	3300
	钢板铺垫	m ²	3700	7800	0	4000
	彩旗绳围栏	m	2580	5265	135	2970
施工道路区	临时排水沟	m ³	2133	2133	0	2100
	素土夯实	m ³	2133	2133	0	2100

4.3 水土保持工程设计情况

项目水土保持设计用地防治区的数量、位置、防护措施未发生变化，各项措施基本在计划内实施中。

5 相关管理情况

5.1 建设单位水土保持管理

建设单位贯彻落实《水土保持法》，成立了水土保持工作领导小组，有具体负责水土保持工作的专管人员、水土保持工作制度等，组织管理和本项目水土保持方案的实施，对水土保持工作进行规范化管理。

5.2 水土保持监测意见落实情况

日常监测过程中，项目部根据施工现场实际情况提出水土保持相应建议，建设单位针对监测单位现场监测和检查过程中提出的水土保持问题，及时安排整改和完善。通过对问题的提出、整改和跟踪调查，有力地推进了水土保持措施实施。

6 问题及建议

(1) 山丘区部分塔基和施工便道临时拦挡措施防护不到位，存在溜坡隐患，应加强临时拦挡措施的实施；

(2) 部分塔基有冲沟发育，要尽快平整冲沟；

(3) 加强现场塔基区土地整治及植被恢复。

7 综合评价

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（水保[2020]161号）的相关规定，评价陕西段线路工程本季度水土保持效果为黄色。

8 下步工作计划

(1) 落实现场整改情况的统计。结合黄委下发《关于抓紧落实生产建设项目水土保持植物措施的通知》，督促施工单位认真落实。


(2) 收集资料。主要有主体工程施工进度、水土保持工程施工进度、降雨量和风力、以及相关水土保持的现场情况等；

(3) 向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报；遇突发事件，及时提供专题报告和影像资料。

(4) 坚持巡检制度。发现问题及时与施工单位沟通，遇较难解决的问题，及时向业主反映。

9 附件及照片

9.1 影像资料

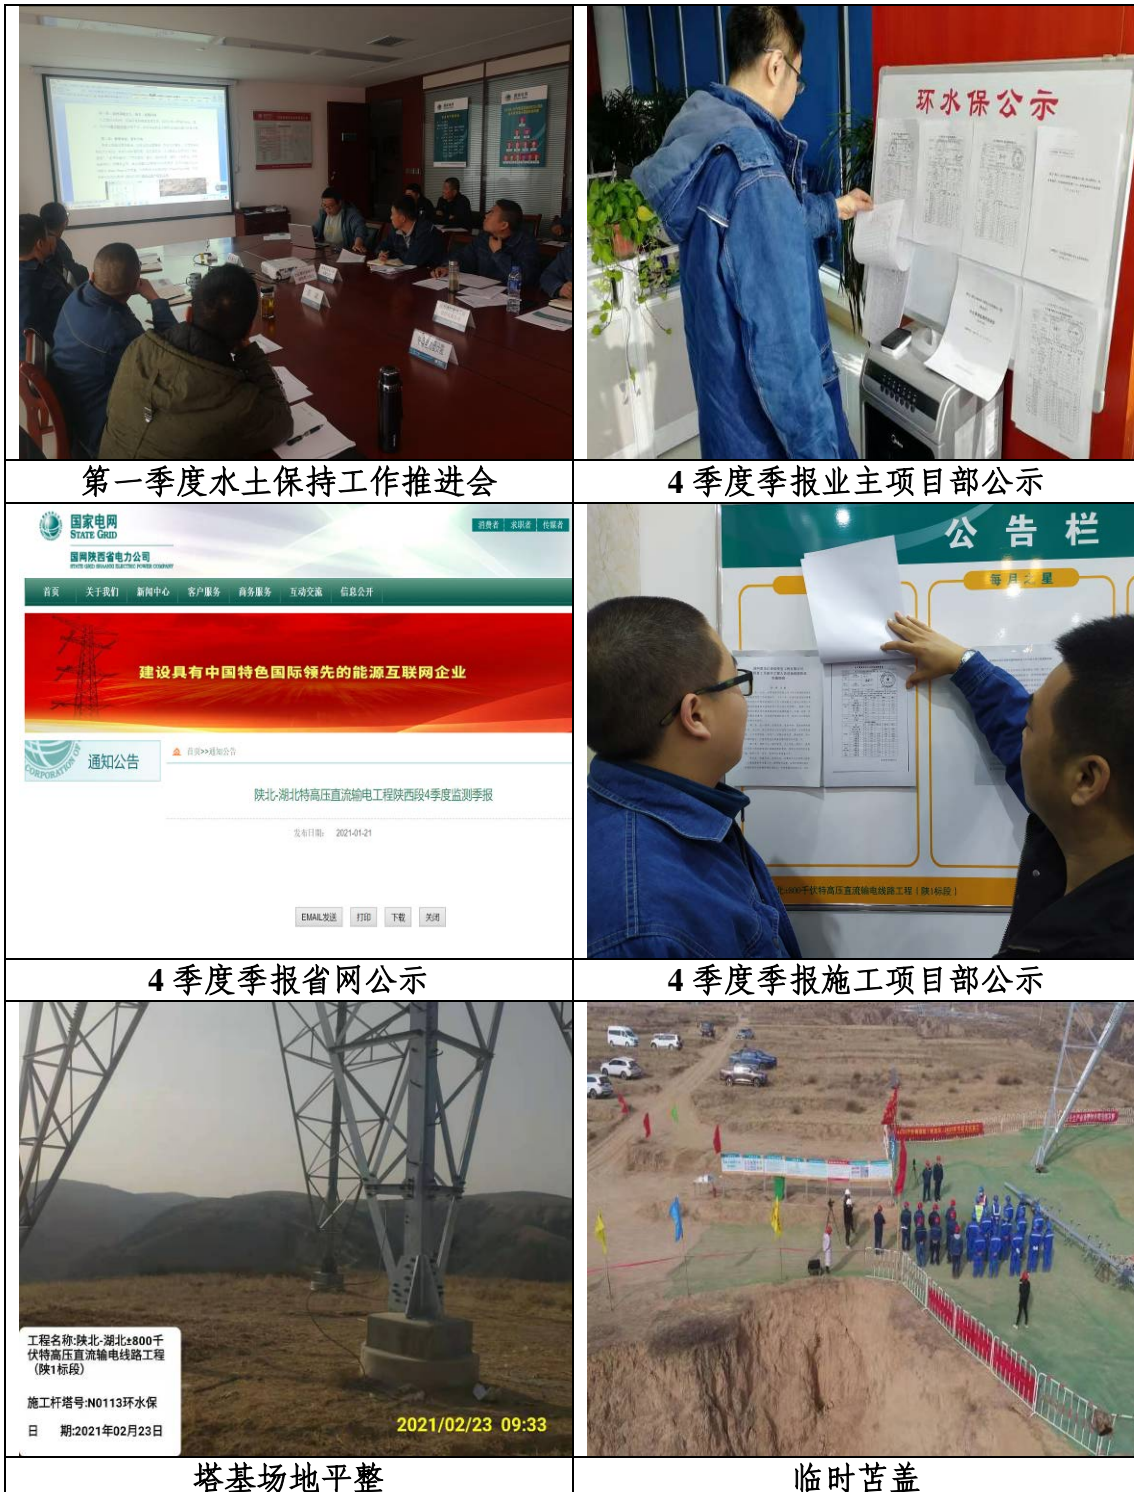

第一季度水土保持工作推进会


4 季度季报业主项目部公示









4 季度季报省网公示

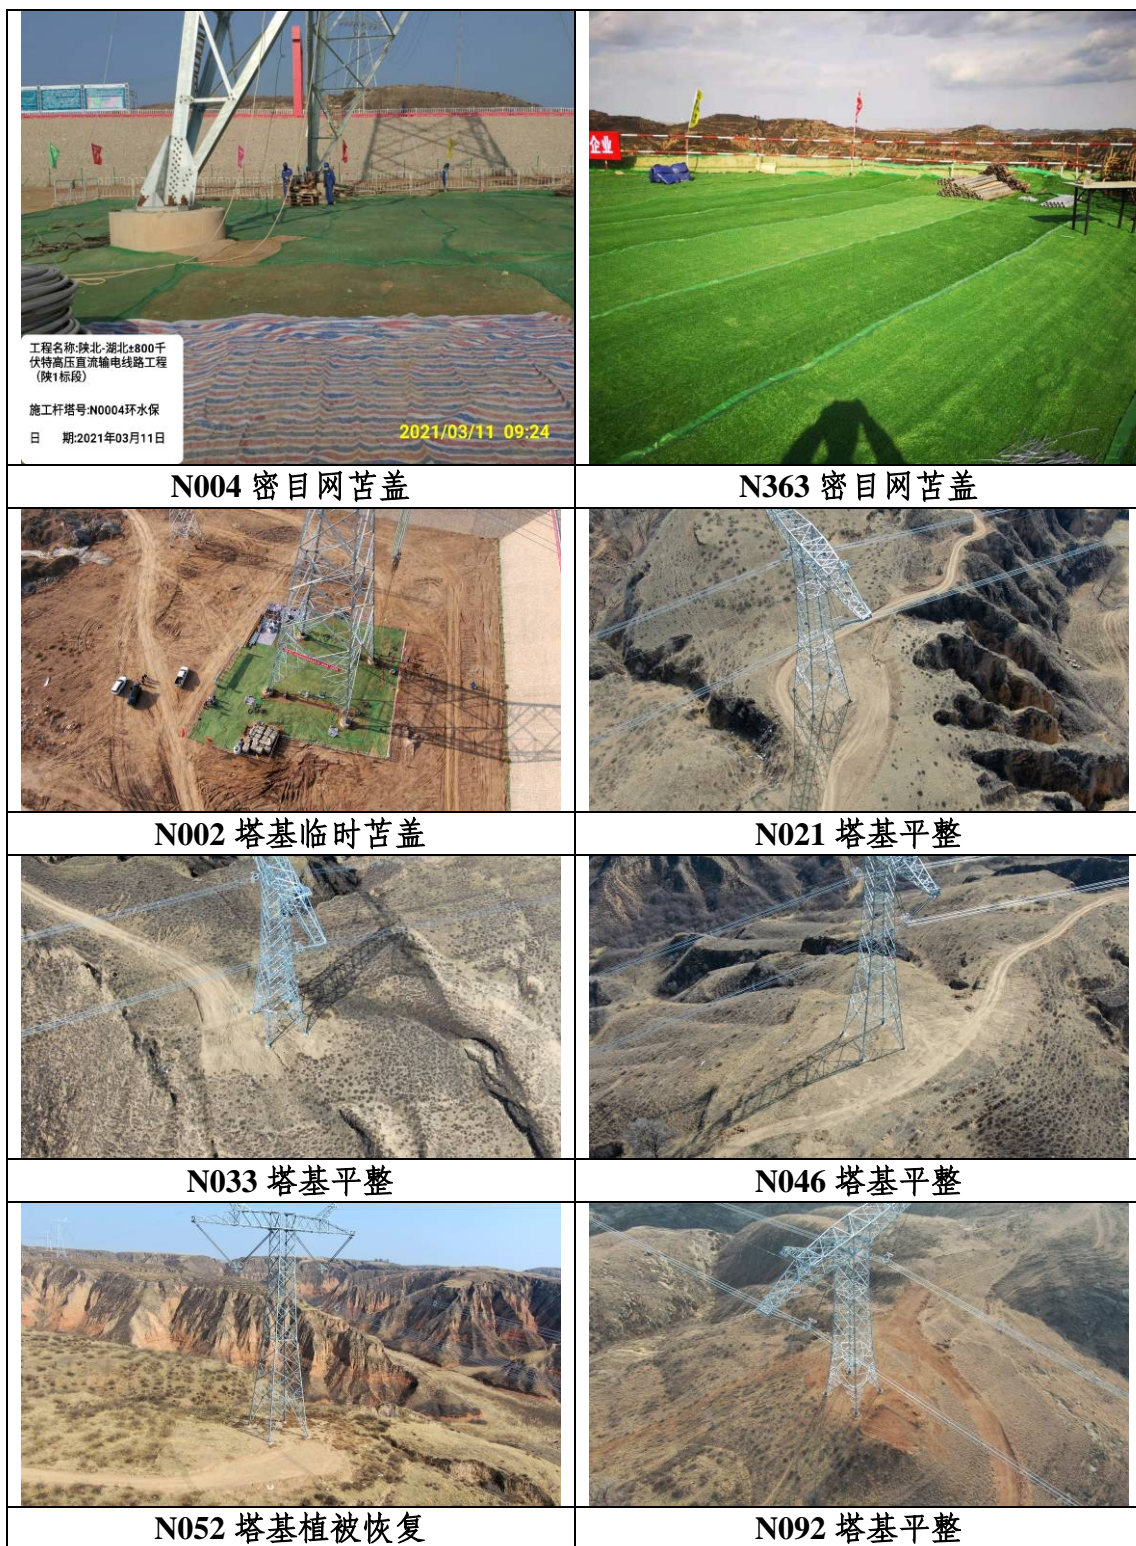4 季度季报施工项目部公示





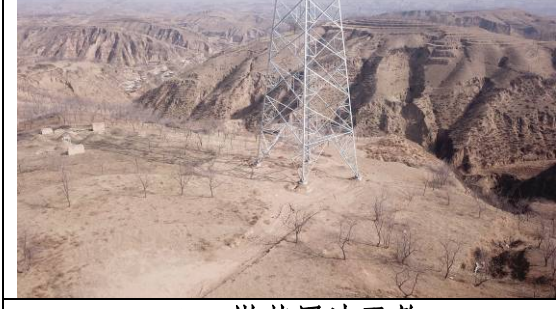





塔基场地平整

临时苫盖



	
<p>N106 塔基周边平整</p>	<p>N134 塔基周边平整</p>
	
<p>N156 塔基周边平整</p>	<p>N169 塔基周边平整</p>
	
<p>N257 塔基周边平整</p>	<p>N264 塔基周边平整</p>
	
<p>N323 塔基临时苫盖</p>	<p>N423 塔基平整</p>

9.2 典型问题及整改建议

省段	标段	施工区域/塔基号	存在问题	现场照片	整改完成情况
陕西 直流 线路	陕西 1标	N0074	塔位下边坡有细小冲沟发育		
陕西 直流 线路	陕西 1标	N0076	塔位下边坡有细小冲沟发育		
陕西 直流 线路	陕西 1标	N0077	塔位下边坡有细小冲沟发育		
陕西 直流 线路	陕西 1标	N0081	塔位下边坡有细小冲沟发育		
陕西 直流 线路	陕西 1标	N0084	塔基区施工废料未清理干净		

9 附件和照片

省段	标段	施工区域 /塔基号	存在问题	现场照片	整改完成情况
陕西 直流 线路	陕西 1 标	N0116	塔基区施 工废料未 清理干净		
